



IMPLANTAÇÕES DW

- Cobrança:** permanece em homologação a malha de carga do “Crédito Tributário”
- IPVA:**
 - Fase 1 (lançamentos): relacional não iniciado
 - Fase 3 (débitos/veículos): stages em andamento
- Simples Nacional:**
 - DAF607 e DASD: relacional não implantado
 - DEFIS: stages iniciadas
 - DeSTDA: relacional não iniciado
 - AINF, COMPSN, PARCSN: stages em andamento
- Malha Indicadores:** entregue o primeiro indicador da malha do SPF (IGF)
- ECD:** malha carga pré-stage em andamento
- Exportações:** malha carga pré-stage não iniciada

MANUTENÇÕES DW

- Cadastro:** malha de carga das novas origens de dados cadastrais em desenvolvimento
- Nova carga Cadastro:** a replicação do CIF ainda está pendente
- Cartão de Crédito:** relacional não implantado
- Portal Administrativo:** realizados ajustes para disponibilizar manutenção tabelas IGF
- Tabelas de Referência:** em andamento o Projeto de melhorias das tabelas de domínio
- Controle da Fiscalização:** realizada correção de CNPJ fiscalizado (sistema CAF/OSF)

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **14 auditores** (1ª DRR)
- Na **integração das camadas semânticas** foram finalizados ajustes finais da semântica e migração de painéis compartilhados. Está em andamento o levantamento/migração dos principais relatórios/painéis pessoais (“gap”) e preparação do ambiente (unificação Projetos MicroStrategy “DW Corporativo” e “RAF-DW”)
- BI AGSN:** realizados novos ajustes na semântica do projeto PGDAS-D
- BI ITCMD:** paralisado apoio para evolução de relatórios e painéis

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes**
- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- DW IPVA: ainda **não foi assinado** Convênio com Detran para acesso a dados do DCV
- A Celepar ainda **não implantou o monitoramento** dos servidores e aplicações de ETL/BI

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

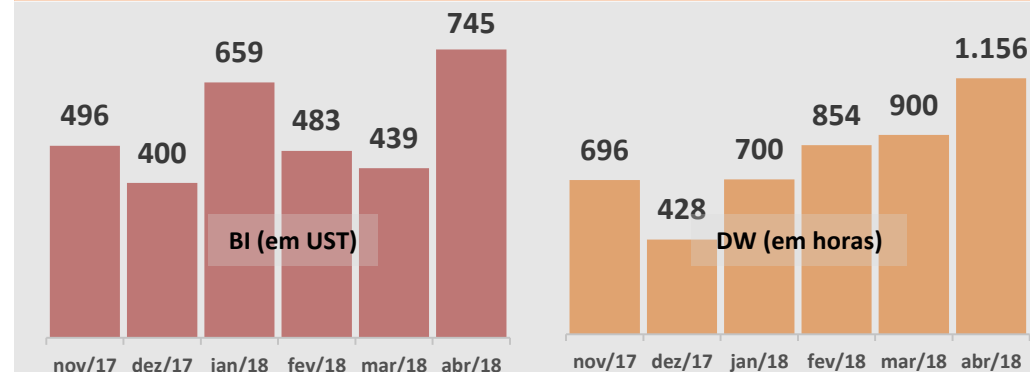



Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

BUSINESS INTELLIGENCE

IPVA	iniciar desenvolvimento relacional Fase 1 (lançamentos) finalizar desenvolvimento stages Fase 3 (débitos e veículos)
SIMPLES NACIONAL	desenvolvimento stages AINF, COMPSN e PARCSN finalizar desenvolvimento stages DEFIS implantar relacional do DASD e DAF607
CARTÃO DE CRÉDITO	implantar relacional
COBRANÇA	finalizar homologação malha de carga do “Crédito Tributário” implantar replicação CIF (inclusive controle histórico)
CADASTRO	implantar a malha de carga das novas origens de dados implantar novo dimensional
DOCUMENTOS FISCAIS	continuar carga histórica dos dados de cupom fiscal/itens informados em EFD
TABELAS DE REFERÊNCIA	finalizar Fase 1 e iniciar Fase 2 projeto das tabelas de domínio
ECD	finalizar desenvolvimento de malha de carga para pré-stage
EXPORTAÇÕES	iniciar desenvolvimento de malha de carga para pré-stage

INTEGRAÇÃO PROJETOS	iniciar migração dos principais relatórios/painéis dos usuários ('gap') preparar o ambiente (cubos, acessos, atalhos, pastas, nomenclatura) preparar a estratégia de implantação
RAF	apoio técnico presencial de um consultor na IGF (parcial)
MENTORING	para auditores da 1ª DRR, 6ª DRR e 14ª DRR



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto Disponível via acesso direto E via MicroStrategy Descontinuado

BDF SÍNTegra	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Outras origens: Cadin, Nota Paraná, e-Protocolo, Regime Especial, Scanc, Dvec, Preço Sugerido

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCRE, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

