



IMPLANTAÇÕES DW



Cobrança: “Crédito Tributário” implantado



IPVA:

- Fases 1 e 2 (lançamentos, parcelamentos): relacional finalizado, em fase de homologação
- Fase 3 (débitos): relacional finalizado, em homologação
- Fase 3 (veículos): stages finalizadas



Simples Nacional:

- AINF, COMPSN, PARCSN: stages em andamento
- DEFIS: relacional não iniciado
- DASD (novo leiaute): pré-stage não iniciada
- DAF607: implantado
- DASD: em fase de implantação



ECD: views Sandbox disponibilizadas

MANUTENÇÕES DW



Cadastro: update de Pessoas nas tabelas de documentos fiscais e itens demandou correções relacionadas ao participante



Nova carga Cadastro: replicação CIF finalizada



Marcas: não iniciado o desenvolvimento das marcas cadastro de CT-e OS e BP-e



Documentos Fiscais: iniciada evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD



Tabelas de Referência: fase 1 implantada; fase 2 em andamento

INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **13 auditores** (1ª DRR)



A **integração das camadas semânticas** está pronta para entrar em produção, aguardando a revisão de pastas e nomenclaturas e a conclusão de atualizações cadastrais no DW (unificação Projetos MicroStrategy “DW Corporativo” e “RAF-DW”)

IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ DW IPVA: Convênio com Detran para acesso a dados do DCV ainda pendente mas em fase final
- ▶ Carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD foi paralisada (requer ajustes)
- ▶ Monitoramento dos servidores e aplicações de ETL/BI em fase final de implantação pela Celepar
- ▶ Problemas na implantação do Cadastro novas origens gerou atraso no início de outras atividades, inclusive na implantação do novo projeto unificado MicroStrategy

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

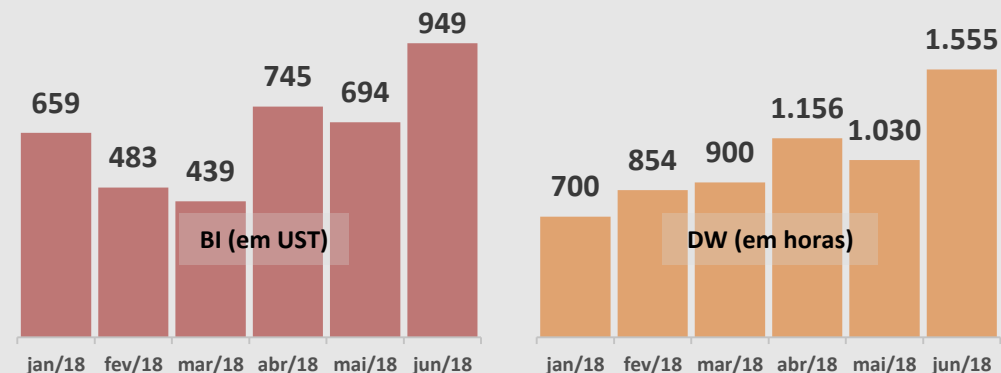



Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA

implantar o relacional fase 1 (lançamentos), fase 2 (parcelamentos) e fase 3 (débitos)

iniciar desenvolvimento do relacional fase 3 (veículos)

SIMPLES

desenvolvimento das stages AINF, COMPSN e PARCSN

iniciar desenvolvimento do relacional DEFIS

NACIONAL

finalizar desenvolvimento da pré-stage DASD (novo layout)

finalizar implantação relacional do DASD

CADASTRO

finalizar updates nas tabelas de documentos fiscais e itens

iniciar desenvolvimento da carga das marcas CT-e OS e BP-e

DOCUMENTOS FISCAIS

continuar evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD

TABELAS DE

REFERÊNCIA

finalizar fase 2 e iniciar fase 3 do projeto das tabelas de domínio

AMBIENTE

realizar migração da versão de banco de dados para 16.10

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRAÇÃO PROJETOS

finalizar revisão de pastas e nomenclaturas

realizar implantação do novo projeto

RAF

apoio técnico presencial de um consultor na IGF (parcial)

MENTORING

para auditores da 1ª DRR



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTegra	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

⊗ Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Outras origens: Cadin, Nota Paraná, e-Protocolo, Regime Especial, Scanc, Dvec, Preço Sugerido

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCRE, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

