



IMPLANTAÇÕES DW

- Ciência de Dados:** finalizada a preparação dos dados, a modelagem para novo algoritmo de dívida ativa e fase de análise dos resultados. Realizada a entrega do RACE
- ADRC-ST:** relacional e dimensional implantados
- DIMP:** carga pré-stage em homologação
- E-PAF:** desenvolvimento paralisado
- E-Protocolo:** desenvolvimento do relacional ainda em andamento

MANUTENÇÕES DW / BI

- Sustentação:**
 - em homologação a correção da carga de endereços origem DF
 - em implantação a correção da carga de eventos CT-e
 - implantada evolução da carga stage NF-e (loop)
- Arquitetura:** ajustes no servidor externo do BI para solucionar problemas de instabilidade do ambiente em conjunto com a Celepar ainda estão pendentes
- Monitoramento:** migração do Enterprise Manager para o Platform Analytics despriorizada

INICIATIVAS BI


- BI ADRC-ST:** levantamento dos cruzamentos e malhas iniciado
- BI Benefícios Fiscais:** finalizado levantamento e desenho definitivos, desenvolvimento não iniciado
- BI DFe:** retomado desenvolvimento do dossier
- BI ECD:** produto pronto para publicação, aguarda definição da IGF quanto a perfil de acesso
- BI SPF:** iniciada homologação do dossier
- Treinamento:**
 - gravação de vídeos tutoriais BI em andamento (72% concluído)
 - preparação do treinamento online não realizada
- Camada Semântica:** ADRC-ST, Exportação (EFD) e Preço Sugerido não realizados; RH realizado

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento)
- Treinamentos BI foram **suspensos** pela EFAZ devido à pandemia Covid-19
- Os trabalhos de definição de escopo para o BI Novo SIAF **não foram iniciados**, aguardando manifestação da área demandante

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

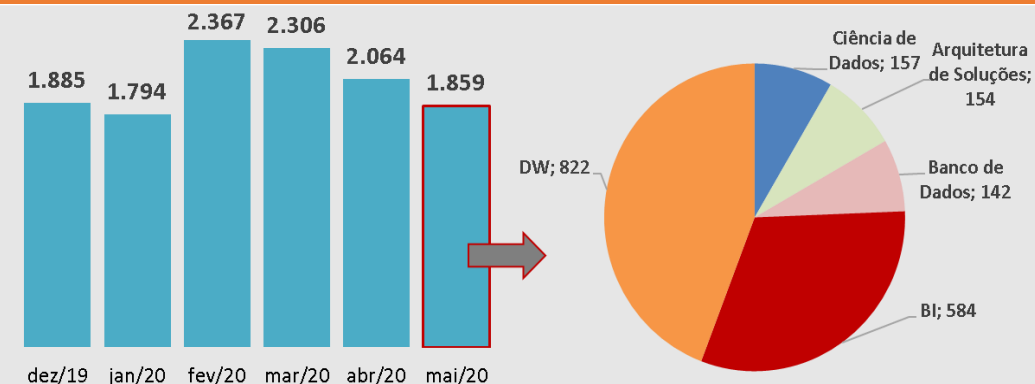



Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- aguardar homologação da classificação das dívidas pela IGA
ADRC-ST	- iniciar desenvolvimento relacional Fase 2 (centro de distribuição)
DIMP	- finalizar homologação da carga em pré-stage e implantar - iniciar desenvolvimento da stage e relacional
E-PROTOCOLO	- aguardar adequação da origem para contemplar o histórico (Celepar) - finalizar desenvolvimento do relacional
SUSTENTAÇÃO	- homologar e reprocessar dados de endereço de Documento Fiscal - implantar a correção da carga de eventos CT-e e reprocessar

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- aguardar definição de requisitos (IGF) - fechar escopo dos relatórios e cruzamentos/malhas
BI BENEFÍCIOS FISCAIS	- iniciar modelagem de dados e definição dos protótipos das telas
BI DF-E	- continuar desenvolvimento do dossier
BI ECD	- aguardar definição da IGF quanto a perfil de acesso para publicação e divulgação
BI NOTEIRAS	- iniciar levantamento de escopo
BI SPF	- finalizar homologação e realizar implantação do dossier - aguardar definição quanto a perfil de acesso (IGF)
ARQUITETURA	- finalizar ajustes no servidor externo do BI para solucionar problemas de instabilidade do ambiente (Celepar)
CAMADA SEMÂNTICA	- mapear dados do ADRC-ST - mapear dados de Exportação (EFD) - mapear dados do Preço Sugerido
TREINAMENTO	- continuar gravação dos áudios dos vídeos tutoriais - preparação treinamento online



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST									

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS SISCREB, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

